ID		Naziv naloge	Začetek	Zaključek	Trajanje	Stroški
1						
2		**PRIČETEK INVESTICIJE**	**Tor 2.2.16**			**€1.640.000,00**
3		**odločitev investitorja**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
4		pisni sklep o pričetku investicije	Tor 2.2.16	Pon 8.2.16	5 dnevi	€0,00
5						
6		**1 FAZA**	**Sre 20.1.16**			**€1.647.000,00**
7		**IDEJNE REŠITVE IN DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKE PROJEKTA**	**Tor 9.2.16**			**€17.000,00**
8		**IZDELAVA IDEJNIH REŠITEV (IDR)**	**Tor 9.2.16**			**€17.000,00**
9		**narročilo idejnih rešitev**	**Tor 9.2.16**			**€15.000,00**
10		izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IDR	Tor 9.2.16	Pon 21.3.16	30 dnevi	€0,00
11		**izbor izvajalca IDR**	**Sre 2.2.16**			**€15.000,00**
12		sklep o izboru izvajalca IDR	Tor 22.2.16	Pon 4.4.16	30 dnevi	€15.000,00
13		**izdelava IDR v variantah**	**Sre 23.3.16**			**€0,00**
14		pregled obstoječih strokovnih podlag	Tor 12.4.16	Pon 25.4.16	10 dnevi	€0,00
15		pregled že izvedenih idejnih projektnih rešitev	Ned 10.4.16	Čet 28.4.16	10 dnevi	€0,00
16		pregled obstoječih omejitev v prostoru	Ned 10.4.16	Čet 28.4.16	6 dnevi	€0,00
17		priprava pregleda razlaga potrebnih strokovnih podlag	Ned 10.4.16	Čet 28.4.16	6 dnevi	€0,00
18		priprava osnutka dokumenta IDR v variantah	Ned 10.4.16	Čet 12.5.16	15 dnevi	€0,00
19		usklajevanje osnutka IDR z naročnikom	Tor 10.5.16	Pon 16.5.16	5 dnevi	€0,00
20		**izdelava IDR v variantah**	**Čet 5.5.16**			**€0,00**
21		IDR	Čet 12.5.16	Sre 25.5.16	10 dnevi	€0,00
22		predaja IDR naročniku	Čet 26.5.16	Pet 27.5.16	2 dnevi	€0,00
23		**recenzija IDR**	**Pon 16.1.16**			**€2.000,00**
24		sklep o ustanovi recenzijske skupine za IDR	Pon 30.5.16	Tor 24.5.16	2 dnevi	€0,00
25		pseudoizvajanje IDR recenzentom	Ned 30.5.16	Tor 31.5.16	2 dnevi	€0,00
26		recenzija IDR	Sre 1.6.16	Tor 14.6.16	10 dnevi	€2.000,00
27		**predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju**	**Ned 18.6.16**			**€0,00**
28		recenzijski zapisnik za IDR v variantah	Sre 22.6.16	Tor 28.6.16	5 dnevi	€0,00
29		**dopolnitev IDR po recenziji**	**Ned 17.6.16**			**€0,00**
30		pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za IDR	Sre 29.6.16	Čet 30.6.16	2 dnevi	€0,00
31		**dopolnitev oz. prilagoditev IDR po recenziji**	**Ned 17.6.16**			**€0,00**
32		IDR (po recenziji)	Ned 27.6.16	Ned 8.7.16	10 dnevi	€0,00
33		predaja IDR (po recenziji) naročniku	Ned 10.7.16	Tor 12.7.16	2 dnevi	€0,00
34		**potrditev IDR**	**Tor 5.7.16**			**€0,00**
35		pregled IDR	Ned 10.7.16	Tor 26.7.16	10 dnevi	€0,00
36		**potrditev IDR s strani naročnika**	**Ned 19.7.16**			**€0,00**
37		sklep o potrditvi IDR	Ned 27.7.16	Tor 2.8.16	5 dnevi	€0,00
38						
39		**IZDELAVA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKE PROJEKTA (DIIP)**	**Tor 9.5.16**			**€13.000,00**
40		**narročilo DIIP**	**Tor 9.5.16**			**€12.000,00**
41		izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za DIIP	Tor 9.2.16	Pon 21.3.16	30 dnevi	€0,00
42		**izbor izvajalca DIIP**	**Tor 14.5.16**			**€12.000,00**
43		sklep o izboru izvajalca DIIP	Tor 23.5.16	Pon 4.6.16	10 dnevi	€12.000,00
44		**izdelava DIIP**	**Čet 30.6.16**			**€0,00**
45		pregled izdelanih IDR v variantah	Čet 26.5.16	Sre 1.6.16	5 dnevi	€0,00
46		pridobitev stroška projekta po variantah iz IDR	Čet 26.5.16	Sre 1.6.16	5 dnevi	€0,00
47		priprava predlaganih parametrov variante	Čet 2.6.16	Sre 15.6.16	10 dnevi	€0,00
48		priprava osnutka DIIP	Čet 9.6.16	Sre 22.6.16	10 dnevi	€0,00
49		usklajevanje osnutka z naročnikom	Tor 21.6.16	Pon 27.6.16	5 dnevi	€0,00
50		**izdelava DIIP za vse variante iz IDR**	**Ned 3.8.16**			**€0,00**
51		DIIP za posamezno varianto	Čet 23.6.16	Sre 6.7.16	10 dnevi	€0,00
52		predaja DIIP naročniku	Čet 7.7.16	Ned 8.7.16	2 dnevi	€0,00
53		**recenzija DIIP**	**Tor 16.8.16**			**€1.000,00**
54		sklep o ustanovi recenzijske skupine za DIIP	Ned 7.7.16	Tor 5.7.16	5 dnevi	€0,00
55		pseudoizvajanje DIIP za vse variante recenzentom	Ned 10.7.16	Tor 12.7.16	2 dnevi	€0,00
56		recenzija DIIP	Sre 13.7.16	Tor 19.7.16	5 dnevi	€1.000,00
57		**predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju**	**Čet 15.9.16**			**€0,00**
58		recenzijski zapisnik za DIIP (po variantah	Sre 20.7.16	Tor 26.7.16	5 dnevi	€0,00
59		**dopolnitev DIIP v variantah po recenziji**	**Čet 28.9.16**			**€0,00**
60		pridobitev recenzijskega zapisnika oz. recenzijskih priporočil za DIIP	Sre 27.7.16	Čet 28.7.16	2 dnevi	€0,00
61		**dopolnitev oz. prilagoditev DIIP v variantah po recenziji**	**Ned 28.9.16**			**€0,00**
62		DIIP v variantah po recenziji	Sre 27.7.16	Tor 2.8.16	5 dnevi	€0,00
63		predaja DIIP v variantah (po recenziji) naročniku	Sre 3.8.16	Čet 4.8.16	2 dnevi	€0,00
64		**potrditev DIIP v variantah**	**Sre 5.10.16**			**€0,00**
65		sklep o potrditvi DIIP v variantah	Ned 5.8.16	Čet 11.8.16	5 dnevi	€0,00
66						€0,00
67		PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 1 FAZO NAČRTOVANJA	**Sre 20.1.16**			**€957.000,00**
68		**dokončev potrebnih strokovnih podlag**	**Pet 29.4.16**			**€0,00**
69		pregled in opredelitev do predloge potrebnih strokovnih podlag	Pet 29.4.16	Čet 5.5.16	5 dnevi	€0,00
70		usklajevanje investicije s prioritetnostmi	Sre 4.5.16	Čet 5.5.16	2 dnevi	€0,00
71		**priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih podlag**	**Pet 6.5.16**			**€0,00**
72		seznam potrebnih strokovnih podlag za 1 fazo načrtovanja	Pet 6.5.16	Pon 9.5.16	2 dnevi	€0,00
73		**pričetek narročila strokovnih podlag**	**Sre 20.1.16**			**€957.000,00**
74		**geodetske podlage**	**Tor 10.5.16**			**€120.000,00**
75		priprava projektne naloge	Tor 10.5.16	Pon 23.5.16	10 dnevi	€0,00
76		izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Tor 17.5.16	Pon 27.6.16	30 dnevi	€120.000,00
77		**izbor izvajalca**	**Tor 28.6.16**			**€0,00**
78		sklep o izboru izvajalca	Tor 28.6.16	Pon 4.7.16	5 dnevi	€0,00
79		izvajanje naloge	Tor 5.7.16	Pon 19.9.16	55 dnevi	€0,00
80		geodetske raziskave (za fazo IDR in IDZ oz. dIDR)	Tor 10.5.16			€200.000,00
81		priprava projektne naloge	Tor 10.5.16	Pon 30.5.16	15 dnevi	€0,00
82		izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Tor 31.5.16	Pon 11.7.16	30 dnevi	€200.000,00
83		**izbor izvajalca**	**Tor 12.7.16**			**€0,00**
84		sklep o izboru izvajalca	Tor 12.7.16	Pon 18.7.16	5 dnevi	€0,00
85		izvajanje naloge	Tor 19.7.16	Pon 10.10.16	60 dnevi	€0,00
86		hidrološka študija	Tor 10.5.16			€150.000,00
87		priprava projektne naloge	Tor 10.5.16	Pon 30.5.16	15 dnevi	€0,00
88		izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Tor 31.5.16	Pon 11.7.16	30 dnevi	€150.000,00
89		**izbor izvajalca**	**Tor 12.7.16**			**€0,00**
90		sklep o izboru izvajalca	Tor 12.7.16	Pon 18.7.16	5 dnevi	€0,00
91		izvajanje naloge	Tor 19.7.16	Pon 10.10.16	60 dnevi	€0,00
92		ihtiološke raziskave	Tor 10.5.16			€120.000,00
93		priprava projektne naloge	Tor 10.5.16	Pon 30.5.16	15 dnevi	€0,00
94		izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Tor 31.5.16	Pon 11.7.16	30 dnevi	€120.000,00
95		**izbor izvajalca**	**Tor 12.7.16**			**€0,00**
96		sklep o izboru izvajalca	Tor 12.7.16	Pon 18.7.16	5 dnevi	€0,00
97		izvajanje naloge	Tor 19.7.16	Pon 17.7.17	250 dnevi	€0,00
98		raziskave fevne in flore	Tor 10.5.16			€150.000,00
99		priprava projektne naloge	Tor 10.5.16	Pon 30.5.16	15 dnevi	€0,00
100		izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Tor 31.5.16	Pon 11.7.16	30 dnevi	€150.000,00
101		**izbor izvajalca**	**Tor 12.7.16**			**€0,00**
102		sklep o izboru izvajalca	Tor 12.7.16	Pon 18.7.16	5 dnevi	€0,00
103		izvajanje naloge	Tor 19.7.16	Pon 17.7.17	250 dnevi	€0,00
104		hidrološka študija (za potrebe IDR in IDZ oz. dIDR)	Tor 12.7.16			€60.000,00
105		priprava projektne naloge	Tor 12.7.16	Pon 25.7.16	10 dnevi	€0,00
106		izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Tor 26.7.16	Čet 5.9.16	30 dnevi	€60.000,00
107		**izbor izvajalca**	**Čet 6.9.16**			**€0,00**
108		sklep o izboru izvajalca	Tor 6.9.16	Pon 12.9.16	5 dnevi	€0,00
109		izvajanje naloge	Tor 13.10.16	Pon 12.12.16	45 dnevi	€0,00
110		**vplив na kulturno dediščino**	**Tor 10.5.16**			**€85.000,00**
111		priprava projektne naloge	Tor 10.5.16	Pon 23.5.16	10 dnevi	€0,00
112		**izdelava in izvedba razpisa za oddajo del**	**Tor 24.5.16**	**Pon 4.7.16**	**30 dnevi**	**€85.000,00**
113		izbor izvajalca	Tor 5.7.16			€0,00
114		sklep o izboru izvajalca	Tor 5.7.16	Pon 11.7.16	5 dnevi	€0,00
115		izvajanje naloge	Tor 12.7.16	Pon 17.4.17	200 dnevi	€0,00
116		**kmetijska študija za 1 in 2 fazo**	**Tor 10.5.16**			**€12.000,00**
117		priprava projektne naloge	Tor 10.5.16	Pon 23.5.16	10 dnevi	€0,00
118		**izdelava in izvedba razpisa za oddajo del**	**Tor 24.5.16**	**Pon 4.7.16**	**30 dnevi**	**€12.000,00**
119		izbor izvajalca	Tor 5.7.16			€0,00
120		sklep o izboru izvajalca	Tor 5.7.16	Pon 11.7.16	5 dnevi	€0,00
121		izvajanje naloge	Tor 12.7.16	Pon 5.9.16	40 dnevi	€0,00
122		**ostale strokovne podlage**	**Tor 10.5.16**			**€120.000,00**
123		priprava projektne naloge	Tor 10.5.16	Pon 30.5.16	15 dnevi	€0,00
124		**izdelava in izvedba razpisa za oddajo del**	**Tor 31.5.16**	**Pon 11.7.16**	**30 dnevi**	**€120.000,00**
125		izbor izvajalca	Tor 12.7.16			€0,00
126		sklep o izboru izvajalca	Tor 12.7.16	Pon 18.7.16	5 dnevi	€0,00
127		izvajanje naloge	Tor 19.7.16	Pon 26.4.17	200 dnevi	€0,00
128						€0,00
129		**IZVAJANJE KOMUNIKACIJE V POSTOPKU DPN**	**Sre 20.1.16**			**€600.000,00**
130		**naročila storitev**	**Sre 20.1.16**			**€600.000,00**
131		**naročilo izvajanja komunikacijskih nalog na projektu**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
132		izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Tor 9.2.16	Pon 21.3.16	30 dnevi	€0,00
133		**izbor izvajalca**	**Sre 20.1.16**			**€600.000,00**
134		sklep o izboru izvajalca	Tor 23.2.16	Pon 4.4.16	30 dnevi	€600.000,00
135		**priprava programa komuniciranja na projektu**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
136		analiza potrebnih aktivnosti na projektu	Tor 5.4.16	Pon 18.4.16	10 dnevi	€0,00
137		določitev ciljnih množičnih sub na projektu	Tor 19.4.16	Pon 2.5.16	10 dnevi	€0,00
138		**določitev izvajanja posameznih nalog za posamezni dogodek**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
139		določitev aktivnosti	Tor 3.5.16	Pon 9.5.16	5 dnevi	€0,00
140		določitev potrebnega kadra pa posamezne aktivnost	Tor 10.5.16	Pon 16.5.16	5 dnevi	€0,00
141		izvajanje ugotovitev	Tor 17.5.16	Pon 23.5.16	5 dnevi	€0,00
142		določitev izven programskih aktivnosti investitorja	Tor 24.5.16	Pon 30.5.16	5 dnevi	€0,00
143		osnutek programa komuniciranja	Tor 31.5.16	Pon 13.6.16	10 dnevi	€0,00
144		usklajevanje z naročnikom	Tor 14.6.16	Pon 20.6.16	5 dnevi	€0,00
145		**priprava programa komuniciranja na projektu**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
146		program komuniciranja na projektu	Tor 21.6.16	Sre 22.6.16	2 dnevi	€0,00
147		predaja programa investitorju	Čet 23.6.16	Pet 24.6.16	2 dnevi	€0,00
148						
149		**PRIČETEK POSTOPKA PRIPRAVE DPN**	**Sre 20.1.16**			**€40.000,00**
150		**NAROČILO POBUDE**	**Sre 20.1.16**			**€40.000,00**
151		**naročilo Pobude**	**Sre 20.1.16**			**€40.000,00**
152		izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za izdelavo Pobude	Ned 13.3.16	Čet 23.6.16	30 dnevi	€40.000,00
153		**izbor izvajalca**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
154		sklep o izboru izdelovalca Pobude	Pet 24.6.16	Čet 30.6.16	5 dnevi	€0,00
155		**PRIPRAVA POBUDE**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
156		**izdelava Pobude**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
157		pregled obstoječega stanja prostora in omejitve v njem (z javno dostopnih	Ned 1.7.16	Ned 11.7.16	7 dnevi	€0,00
158		pridobitev in pregled projekt dokumentacije	Tor 12.7.16	Pon 25.7.16	10 dnevi	€0,00
159		priprava osnutka Pobude v variantah	Tor 26.7.16	Pon 8.8.16	10 dnevi	€0,00
160		usklajevanja z naročnikom in izdelovalcem IDR in DIIP	Tor 9.8.16	Pon 15.8.16	5 dnevi	€0,00
161		**izdelava Pobude**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
162		Pobuda z dobičnejšo variant	Tor 16.8.16	Pon 22.8.16	5 dnevi	€0,00
163		predaja pobude naročniku	Tor 23.8.16	Sre 24.8.16	2 dnevi	€0,00
164		**recenzija Pobude**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
165		**recenzija s strani naročnika**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
166		sklep o dobičnej recenzijske skupine za Pobudo	Čet 25.8.16	Pet 26.8.16	2 dnevi	€0,00
167		pseudoizvajanje Pobude recenzentom	Ned 28.8.16	Tor 30.8.16	2 dnevi	€0,00
168		**recenzija Pobude**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
169		recenzijsko poročilo	Sre 31.8.16	Tor 13.9.16	10 dnevi	€0,00
170		predaja recenzijskega poročila naročniku	Sre 14.9.16	Čet 15.9.16	2 dnevi	€0,00
171		**recenzija ureditvenega pobudnika (MAP) in koordinatorja (MOP)**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
172		pregled Pobude z dobičnejšo variant	Sre 31.8.16	Tor 13.9.16	10 dnevi	€0,00
173		**priprava recenzijskega poročila**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
174		recenzijsko poročilo s podatkmi pripomba	Sre 14.9.16	Tor 20.9.16	5 dnevi	€0,00
175		predaja recenzijskega poročila investitorju	Sre 21.9.16	Čet 22.9.16	2 dnevi	€0,00
176		**dopolnitev Pobude po recenziji**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
177		pridobitev in pregled pripomb investitorja kot tudi pobudnika in koordinatorja	Pet 23.9.16	Čet 29.9.16	5 dnevi	€0,00
178		**dopolnitev Pobude po recenziji**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
179		Pobuda po recenziji	Pet 30.9.16	Čet 13.10.16	10 dnevi	€0,00
180		predaja pobude investitorju	Pet 14.10.16	Pon 17.10.16	2 dnevi	€0,00
181		**uradna predaja pobude**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
182		investitor preda pobudo pobudniku (MAP)	Tor 18.10.16	Sre 19.10.16	2 dnevi	€0,00
183		pobudnik (MAP) preda pobudo koordinatorju (MOP)	Čet 20.10.16	Sre 26.10.16	5 dnevi	€0,00
184						€0,00
185		**Izvajanje programa v postopku POBUDE IN ANALIZE SMERNIC**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
186		izvajanje komunikacijskih nalog v postopku predstavitve Pobude	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
187		**izvedba posvetov za NUP, lokalne skupnosti in ostali zainteresirani javnosti**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
188		sodelovanje z PR službo ministrstva	Pon 27.6.16	Pet 5.8.16	30 dnevi	€0,00
189		priprava predstavitvenega gradiva	Pon 1.8.16	Pet 5.8.16	5 dnevi	€0,00
190		evidc izpolnjevanje v evidcijo	Sre 10.10.16	Tor 27.12.16	50 dnevi	€0,00
191		predstavljanje učinkov načrtovanega projekta	Sre 10.10.16	Tor 27.12.16	50 dnevi	€0,00
192						€0,00
193		**SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POBUDE IN ANALIZE SMERNIC**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
194		**izdelek Pobude**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**
195		sodelovanje pri izdelovanju IDR v variantah v izdelek Pobude	Ned 29.7.16	Čet 11.8.16	10 dnevi	€0,00
196		**Analiza smernic**	**Sre 20.1.16**			**€0,00**

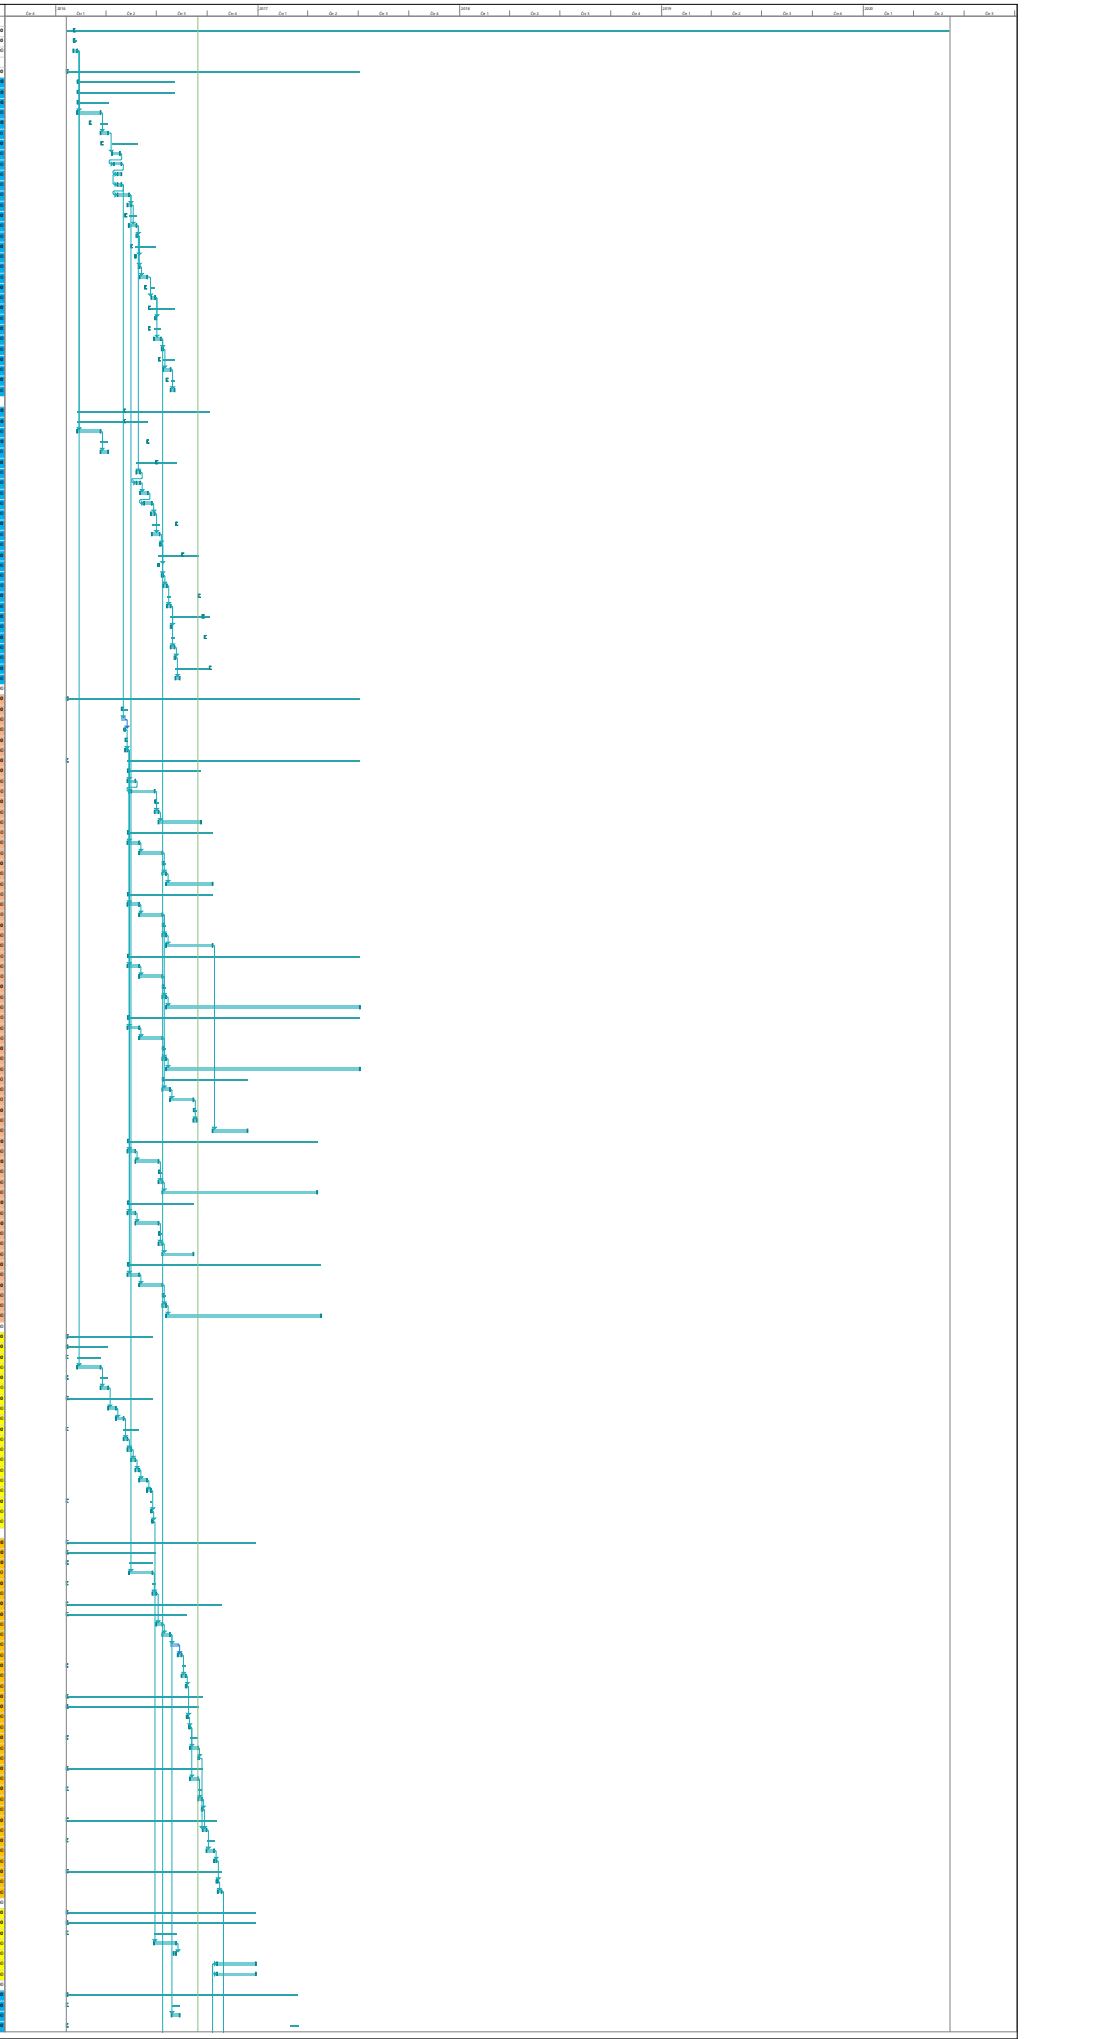

Projekt zlogin TP15, 16 V2

ID	Naziv opravila	Začetek	Zaključek	Trajanje	Stroški
197	izdelovanje pr pripravi Analize smernic vezanih na Pobude	tor 28.2.17	Pet 12.1.18	10 dnevi	€0,00
198					€0,00
199	**ODLOČBA O CPVO**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
200	**pregled Pobude**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
201	pridobitev gradiva s strani koordinatorja	Čet 27.10.16	Pet 28.10.16	2 dnevi	€0,00
202	analiza pridobljenega gradiva	Pon 31.10.16	Pet 18.11.16	15 dnevi	€0,00
203	udeležba na posvetu	Pon 21.11.16	Pon 21.11.16	1 dan	€0,00
204	**odločba o CPVO**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
205	analiza vplivov na okolje na podlagi podrobnih Pobude	tre 9.11.16	Tor 15.11.16	5 dnevi	€0,00
206	**odločitev o potrebnosti izvedbe CPVO**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
207	Odločba o CPVO	tre 16.11.16	Tor 22.11.16	5 dnevi	€0,00
208	poredovanje odločba o CPVO koordinatorju	tre 23.11.16	Čet 24.11.16	2 dnevi	€0,00
209					€0,00
210	**ANALIZA SMERNIC**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
211	**pridobitev smernic**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
212	**objava Pobude**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
213	pošiljanje gradiva NUP, lokalni skupnosti	Čet 27.10.16	Pet 28.10.16	2 dnevi	€0,00
214	objava gradiva na svetovnem spletu	Pon 31.10.16	Tor 1.11.16	2 dnevi	€0,00
215	**izvedba posveta**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
216	predstavitev Pobude NUP	tre 9.11.16	Tor 22.12.16	30 dnevi	€0,00
217	predstavitev Pobude lokalni skupnosti	tre 9.11.16	Tor 20.12.16	30 dnevi	€0,00
218	predstavitev Pobude zainteresirani javnosti	tre 9.11.16	Tor 20.12.16	30 dnevi	€0,00
219	**pridobitev smernic**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
220	pridobitev podrobnih smernic NUO	tre 21.12.16	Tor 27.12.16	5 dnevi	€0,00
221	pridobitev pretogu lokalne skupnosti	tre 21.12.16	Tor 27.12.16	5 dnevi	€0,00
222	pridobitev predlogov javnosti	tre 21.12.16	Tor 27.12.16	5 dnevi	€0,00
223	**zbor smernic in predlogov**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
224	koordinator pošlje vse smernice in predloge	tre 28.12.16	Tor 3.1.17	5 dnevi	€0,00
225	pošiljanje smernic in predlogov investitorju in izdelovalcu Pobude	tre 4.1.17	Čet 5.1.17	2 dnevi	€0,00
226	**analiza smernic**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
227	**pregled smernic**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
228	pridobitev smernic in njihov pregled	tre 4.1.17	Čet 19.1.17	10 dnevi	€0,00
229	uvedlitev smernic po vrstah	Pet 20.1.17	Čet 26.1.17	5 dnevi	€0,00
230	**analiza smernic**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
231	sprehitev do posameznih smernic in predlogov	Pet 27.1.17	Pon 27.2.17	22 dnevi	€0,00
232	dodatne potrebnih strokovnih podlag	Tor 28.2.17	Pon 27.2.17	5 dnevi	€0,00
233	priprava osnutka Analize smernic	Tor 28.2.17	Pon 6.3.17	5 dnevi	€0,00
234	usklajevanje osnutka Analize smernic	Tor 7.3.17	Pon 13.3.17	5 dnevi	€0,00
235	**priprava dokumenta**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
236	Analiza smernic	Tor 14.3.17	Pon 20.3.17	5 dnevi	€0,00
237	predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju	Tor 21.3.17	Sre 22.3.17	2 dnevi	€0,00
238	**Prostorska konferenca**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
239	koordinator izdela Prostorsko konferenco	Čet 23.3.17	Sre 29.3.17	5 dnevi	€0,00
240	poredovanje Analize smernic NUP	Čet 23.3.17	Pet 24.3.17	2 dnevi	€0,00
241	pregled Analize smernic s strani NUP	Pon 27.3.17	Pet 31.3.17	5 dnevi	€0,00
242	koordinator pripravi osnutek Sklepa o pripravi DPN	Tor 11.4.17	Sre 12.4.17	2 dnevi	€0,00
243	**izvedba Prostorske konference**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
244	pridobitev pripomb na Analizo smernic ali osnutek Sklepa o pripravi DPN	Pon 3.4.17	Pon 3.4.17	1 dan	€0,00
245	zapisnik Prostorske konference	Tor 4.4.17	Pon 10.4.17	5 dnevi	€0,00
246	dopolnitev Analize smernic	Tor 11.4.17	Pon 17.4.17	5 dnevi	€0,00
247	**dopolnitev Sklepa o pripravi DPN**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
248	Sklep o pripravi DPN	Pet 14.4.17	Pon 17.4.17	2 dnevi	€0,00
249	**Sprejetje na Vladi RS**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
250	poredovanje gradiva za na Vlado RS	Pon 17.4.17	Pet 28.4.17	10 dnevi	€0,00
251	obravnava gradiva na seji Vlade RS	Pon 1.5.17	Pon 1.5.17	1 dan	€0,00
252	**sprejem Sklepa o pripravi DPN na Vladi RS**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
253	odločitev Vlade	Tor 2.5.17	Tor 2.5.17	1 dan	€0,00
254	**diverzite koordinatorja o sprejetju Sklepa o pripravi DPN**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
255	koordinator obvesti investitorja, pobudnika in izdelovalca Pobude	tre 3.5.17	Tor 9.5.17	5 dnevi	€0,00
256	objava Sklepa o pripravi DPN na spletu	tre 3.5.17	Tor 9.5.17	5 dnevi	€0,00
257					
258	**2 FAZA**	**tre 20.1.16**			**€1.105.000,00**
259	**PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 2 FAZO NAČRTOVANJA**	**tre 20.1.16**			**€750.000,00**
260	**dolžitev potrebnih strokovnih podlag**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
261	pregled in opredelitev do dodatnega predloga potrebnih strokovnih podlag	Tor 14.2.17	Pon 20.2.17	5 dnevi	€0,00
262	usklajevanje investitorja s projektantom	Tor 21.2.17	Pon 27.2.17	5 dnevi	€0,00
263	**priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih podlag**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
264	seznam potrebnih dodatnih strokovnih podlag na podlagi smernic	Tor 28.2.17	Sre 29.3.17	2 dnevi	€0,00
265	**začetek narročila strokovnih podlag**	**tre 20.1.16**			**€750.000,00**
266	**potrebna projektorske in skupine strokovne podlage**	**tre 20.1.16**			**€650.000,00**
267	priprava projektne naloge	Čet 30.3.17	Sre 19.4.17	15 dnevi	€0,00
268	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Čet 20.4.17	Sre 31.5.17	30 dnevi	€650.000,00
269	**izbor izvajalca**	**tre 2.2.16**			**€0,00**
270	sklep o izboru izvajalca	Čet 1.6.17	Sre 14.6.17	10 dnevi	€0,00
271	**dodatne tehnične strokovne podlage**	**tre 20.1.16**			**€300.000,00**
272	priprava projektne naloge	Čet 30.3.17	Sre 19.4.17	15 dnevi	€0,00
273	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Čet 20.4.17	Sre 31.5.17	30 dnevi	€300.000,00
274	**izbor izvajalca**	**tre 2.2.16**			**€0,00**
275	sklep o izboru izvajalca	Čet 1.6.17	Sre 14.6.17	10 dnevi	€0,00
276					€0,00
277	**DOPOLNILNE IDEJNE REŠITVE (ZGLEDNE ZASNOVE) IN PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA**	**tre 16.11.16**			**€650.000,00**
278	**IZDELAVA DOPOLNILNIH IDEJNIH REŠITEV (IDDR) zz. IDZ**	**tre 16.11.16**			**€540.000,00**
279	**naročilo dopolnilnih idejnih rešitev**	**tre 16.11.16**			**€140.000,00**
280	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za dopolnjevanje IDR	Pon 18.7.16	Pet 19.8.16	30 dnevi	€0,00
281	**izbor izvajalca dopolnjenih IDR**	**tre 21.9.17**			**€140.000,00**
282	sklep o izboru izvajalca dopolnjenih IDR	Pon 20.8.16	Pet 26.8.16	5 dnevi	€140.000,00
283	**izdelava dopolnjenih IDR v variantah**	**tre 18.1.17**			**€0,00**
284	pregled predloženih smernic NUP in javnosti	Tor 21.3.17	Pon 27.3.17	5 dnevi	€0,00
285	pregled ostalih strokovnih podlag	Tor 28.3.17	Pon 10.4.17	10 dnevi	€0,00
286	seznam dodatnih potrebnih strokovnih podlag zaradi podanih smernic	Tor 11.4.17	Pon 17.4.17	5 dnevi	€0,00
287	priprava osnutka dokumenta dopolnjenih IDR v variantah	Čet 25.5.17	Sre 26.7.17	45 dnevi	€0,00
288	usklajevanje osnutka dopolnjenih IDR z naročnikom	Čet 13.7.17	Sre 26.7.17	10 dnevi	€0,00
289	**izdelava dopolnjenih IDR v variantah**	**Čet 16.3.17**			**€0,00**
290	dopolnjene IDR v variantah	Čet 27.7.17	Sre 9.8.17	10 dnevi	€0,00
291	predaja dopolnjenih IDR v variantah naročniku	Čet 10.8.17	Pet 11.8.17	2 dnevi	€0,00
292	**recenzija IDR**	**Čet 24.3.17**			**€8.000,00**
293	sklep o določitvi recenzijske skupine za dopolnjene IDR v variantah	Pon 7.8.17	Tor 8.8.17	2 dnevi	€0,00
294	poredovanje dopolnjenih IDR v variantah recenzentom	Pon 14.8.17	Tor 15.8.17	2 dnevi	€0,00
295	recenzija dopolnjenih IDR v variantah	Sre 16.8.17	Tor 29.8.17	10 dnevi	€8.000,00
296	**predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju**	**tre 29.3.17**			**€0,00**
297	recenzijski zapisnik za dopolnjene IDR po variantah	Sre 30.8.17	Tor 5.9.17	5 dnevi	€0,00
298	**dopolnitev dopolnjenih IDR v variantah po recenziji**	**tre 5.4.17**			**€0,00**
299	pridobitev recenzijskega zapisnika za recenzijski pripomočil za dopolnjene	tre 6.9.17	Tor 12.9.17	5 dnevi	€0,00
300	**dopolnitev in pripravljene dopolnjenih IDR po recenziji**	**tre 7.4.17**			**€0,00**
301	dopolnjene IDR v variantah po recenziji	tre 13.9.17	Tor 3.10.17	15 dnevi	€0,00
302	predaja dopolnjenih IDR v variantah (po recenziji) naročniku	tre 4.10.17	Čet 5.10.17	2 dnevi	€0,00
303					
304	**IZDELAVA DOKUMENTA PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA (PIZ)**	**tre 16.11.16**			**€17.000,00**
305	**naročilo PIZ**	**tre 16.11.16**			**€15.000,00**
306	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za PIZ	Tor 11.4.17	Pon 22.5.17	30 dnevi	€0,00
307	**izbor izvajalca PIZ**	**tre 28.12.16**			**€15.000,00**
308	sklep o izboru izvajalca PIZ	Tor 23.5.17	Pon 29.5.17	5 dnevi	€15.000,00
309	**izdelava PIZ po variantah iz dopolnjenih IDR**	**tre 11.1.17**			**€0,00**
310	pregled izdelanih dopolnjenih IDR v variantah	Pet 6.10.17	Čet 19.10.17	10 dnevi	€0,00
311	pridobitev strokovne projekta po variantah iz dopolnjenih IDR	Čet 12.10.17	Sre 25.10.17	10 dnevi	€0,00
312	pripravo izračunov in posamezne variante	Čet 26.10.17	Sre 1.11.17	5 dnevi	€0,00
313	priprava osnutka PIZ	Tor 31.10.17	Pon 12.11.17	10 dnevi	€0,00
314	usklajevanje osnutka z naročnikom	Tor 7.11.17	Pon 14.11.17	5 dnevi	€0,00
315	**izdelava PIZ za vse variante iz dopolnjenih IDR**	**tre 1.1.17**			**€0,00**
316	PIZ za posamezno variante	Čet 9.11.17	Sre 15.11.17	5 dnevi	€0,00
317	predaja PIZ naročniku	Čet 16.11.17	Pet 17.11.17	2 dnevi	€0,00
318	**recenzija PIZ**	**tre 18.1.17**			**€2.000,00**
319	sklep o določitvi recenzijske skupine za PIZ	Tor 14.11.17	Sre 15.11.17	2 dnevi	€0,00
320	poredovanje PIZ za vse variante recenzentom	Pon 20.11.17	Tor 21.11.17	2 dnevi	€0,00
321	recenzija PIZ	Sre 22.11.17	Tor 28.11.17	5 dnevi	€2.000,00
322	**predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju**	**tre 16.4.17**			**€0,00**
323	recenzijski zapisnik za PIZ po variantah	Sre 29.11.17	Tor 5.12.17	5 dnevi	€0,00
324	**dopolnitev PIZ v variantah po recenziji**	**Čet 19.4.17**			**€0,00**
325	pridobitev recenzijskega zapisnika za recenzijski pripomočil za PIZ	tre 6.12.17	Čet 7.12.17	2 dnevi	€0,00
326	**dopolnitev in pripravljene PIZ v variantah po recenziji**	**tre 19.4.17**			**€0,00**
327	PIZ v variantah po recenziji	tre 8.12.17	Čet 21.12.17	10 dnevi	€0,00
328	predaja PIZ v variantah (po recenziji) naročniku	Pet 22.12.17	Pon 25.12.17	2 dnevi	€0,00
329					
330	**OKOLJSKO POROČILO (OP) TER CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO)**	**tre 20.1.16**			**€70.000,00**
331	**naročilo OP**	**tre 20.1.16**			**€70.000,00**
332	priprava projektne naloge	tre 21.11.16	Tor 13.12.16	15 dnevi	€0,00
333	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za OP	tre 14.12.16	Tor 24.1.17	30 dnevi	€70.000,00
334	**izbor izvajalca OP**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
335	sklep o izboru izvajalca OP	tre 25.1.17	Tor 7.2.17	10 dnevi	€0,00
336	**izdelava OP**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
337	**predpriprava za OP**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
338	pregled obstoječih strokovnih podlag	Čet 26.6.17	Sre 12.7.17	10 dnevi	€0,00
339	pregled dilok v variantah	Čet 13.7.17	Sre 26.7.17	10 dnevi	€0,00
340	pregled obstoječih okoljskih omejitev v prostoru	Čet 26.6.17	Sre 12.7.17	10 dnevi	€0,00
341	**izvedba SOOPNJA**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
342	priprava gradiva za izvedbo soopnja	Čet 27.7.17	Sre 2.8.17	5 dnevi	€0,00
343	izvedba usklajevanj z MOP, njihovimi strokovnimi službami, koordinatorjem,	Čet 3.8.17	Sre 23.8.17	15 dnevi	€0,00
344	**izvedba soopnja**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
345	predstavitev začetnih ureditev	Čet 3.8.17	Sre 9.8.17	5 dnevi	€0,00
346	usklajevanje	Čet 3.8.17	Sre 23.8.17	15 dnevi	€0,00
347	**pridobitev nabora potrebnih okoljskih strokovnih podlag**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
348	nabor potrebnih strokovnih podlag	Čet 24.8.17	Sre 13.9.17	15 dnevi	€0,00
349	zapisnik soopnja	Čet 7.9.17	Sre 13.9.17	5 dnevi	€0,00
350	predaja zapisov vseh udeležencev	Čet 14.9.17	Pet 15.9.17	2 dnevi	€0,00
351	priprava osnutka OP za vse variante iz dIDR	Čet 27.7.17	Sre 27.9.17	45 dnevi	€0,00
352	usklajevanje osnutka OP z investitorjem, pobudnikom, koordinatorjem,	Čet 7.9.17	Sre 27.9.17	15 dnevi	€0,00
353	**izdelava OP za vse variante**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
354	OP	Čet 14.9.17	Sre 6.10.17	15 dnevi	€0,00
355	predaja OP naročniku	Čet 5.10.17	Pet 6.10.17	2 dnevi	€0,00
356	**pregled in analiza OP**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
357	pregled in analiza OP	Pon 9.10.17	Pet 27.10.17	15 dnevi	€0,00
358	**priprava mnenja o ustreznosti OP**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
359	mnenje o ustreznosti	Pon 30.10.17	Pet 27.10.17	10 dnevi	€0,00
360					€0,00
361	**PRIPRAVA DPN**	**tre 20.1.16**			**€120.000,00**
362	**naročilo izdelave Študije variant (ŠV) in predloga optimalne variante**	**tre 20.1.16**			**€120.000,00**
363	**naročilo ŠV in predloga optimalne variante**	**tre 20.1.16**			**€120.000,00**
364	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	tre 25.1.17	Tor 7.3.17	30 dnevi	€120.000,00
365	**izbor izvajalca**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
366	sklep o izboru izdelovalca ŠV z predlogom optimalne variante	tre 8.3.17	Tor 21.3.17	10 dnevi	€0,00
367	**STUDIJA VARIANT (ŠV)**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
368	**priprava ŠV**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
369	pregled smernic in sklepov iz Analize smernic	tre 22.3.17	Tor 28.3.17	5 dnevi	€0,00
370	pridobitev dopolnjenih IDR, PIZ, okoljskih in prostorskih strokovnih podlag	Pet 6.10.17	Čet 19.10.17	10 dnevi	€0,00
371	priprava osnutka ŠV	Pet 10.10.17	Čet 2.11.17	15 dnevi	€0,00
372	usklajevanje predloga ŠV	Pet 20.10.17	Čet 9.11.17	15 dnevi	€0,00
373	**priprava ŠV**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
374	ŠV	Pet 27.10.17	Čet 16.11.17	15 dnevi	€0,00
375	predaja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju	Pet 17.11.17	Pon 20.11.17	2 dnevi	€0,00
376	**JAVNA RAZGRNITEV (JR) IN JAVNA OBRAVNAVA (JO)**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
377	**priprava gradiva za JR in JO**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
378	priprava povabilov ŠV (vabilovalec ŠV) in OP (vabilovalec OP)	Pet 17.11.17	Čet 23.11.17	5 dnevi	€0,00
379	vabilo(ne izvedbe JR z investitorjem, pobudnikom in koordinatorjem	Pet 17.11.17	Čet 23.11.17	5 dnevi	€0,00
380	**javna razgrnitev**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
381	koordinator objavi obvestilo o javni obravnavi	Pet 24.11.17	Pon 27.11.17	2 dnevi	€0,00
382	poredovanje gradiva NUP in lokalni skupnosti	Pet 24.11.17	Čet 30.11.17	5 dnevi	€0,00
383	objava gradiva na spletu	Pet 24.11.17	Čet 30.11.17	5 dnevi	€0,00
384	javna razgrnitev	Pet 1.12.17	Pon 1.1.18	22 dnevi	€0,00
385	objava izvedbe javne obravnave	Tor 19.12.17	Tor 19.12.17	1 dan	€0,00
386	**izvedba javne obravnave**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
387	gradivo za javno obravnavo	Tor 12.12.17	Pet 18.12.17	5 dnevi	€0,00
388	priprava javne obravnave	Tor 12.12.17	Pon 18.12.17	5 dnevi	€0,00
389	aktivna udeležba na javni obravnavi (pripravljalca DPN, pobudnika,	Tor 19.12.17	Tor 19.12.17	1 dan	€0,00
390					
391	**KOMUNICIRANJE - Faza 2**	**tre 20.1.16**			**€0,00**
392	**izvajanje programa v postopku ŠV in OP**	**tre 20.1.16**			**€0,00**

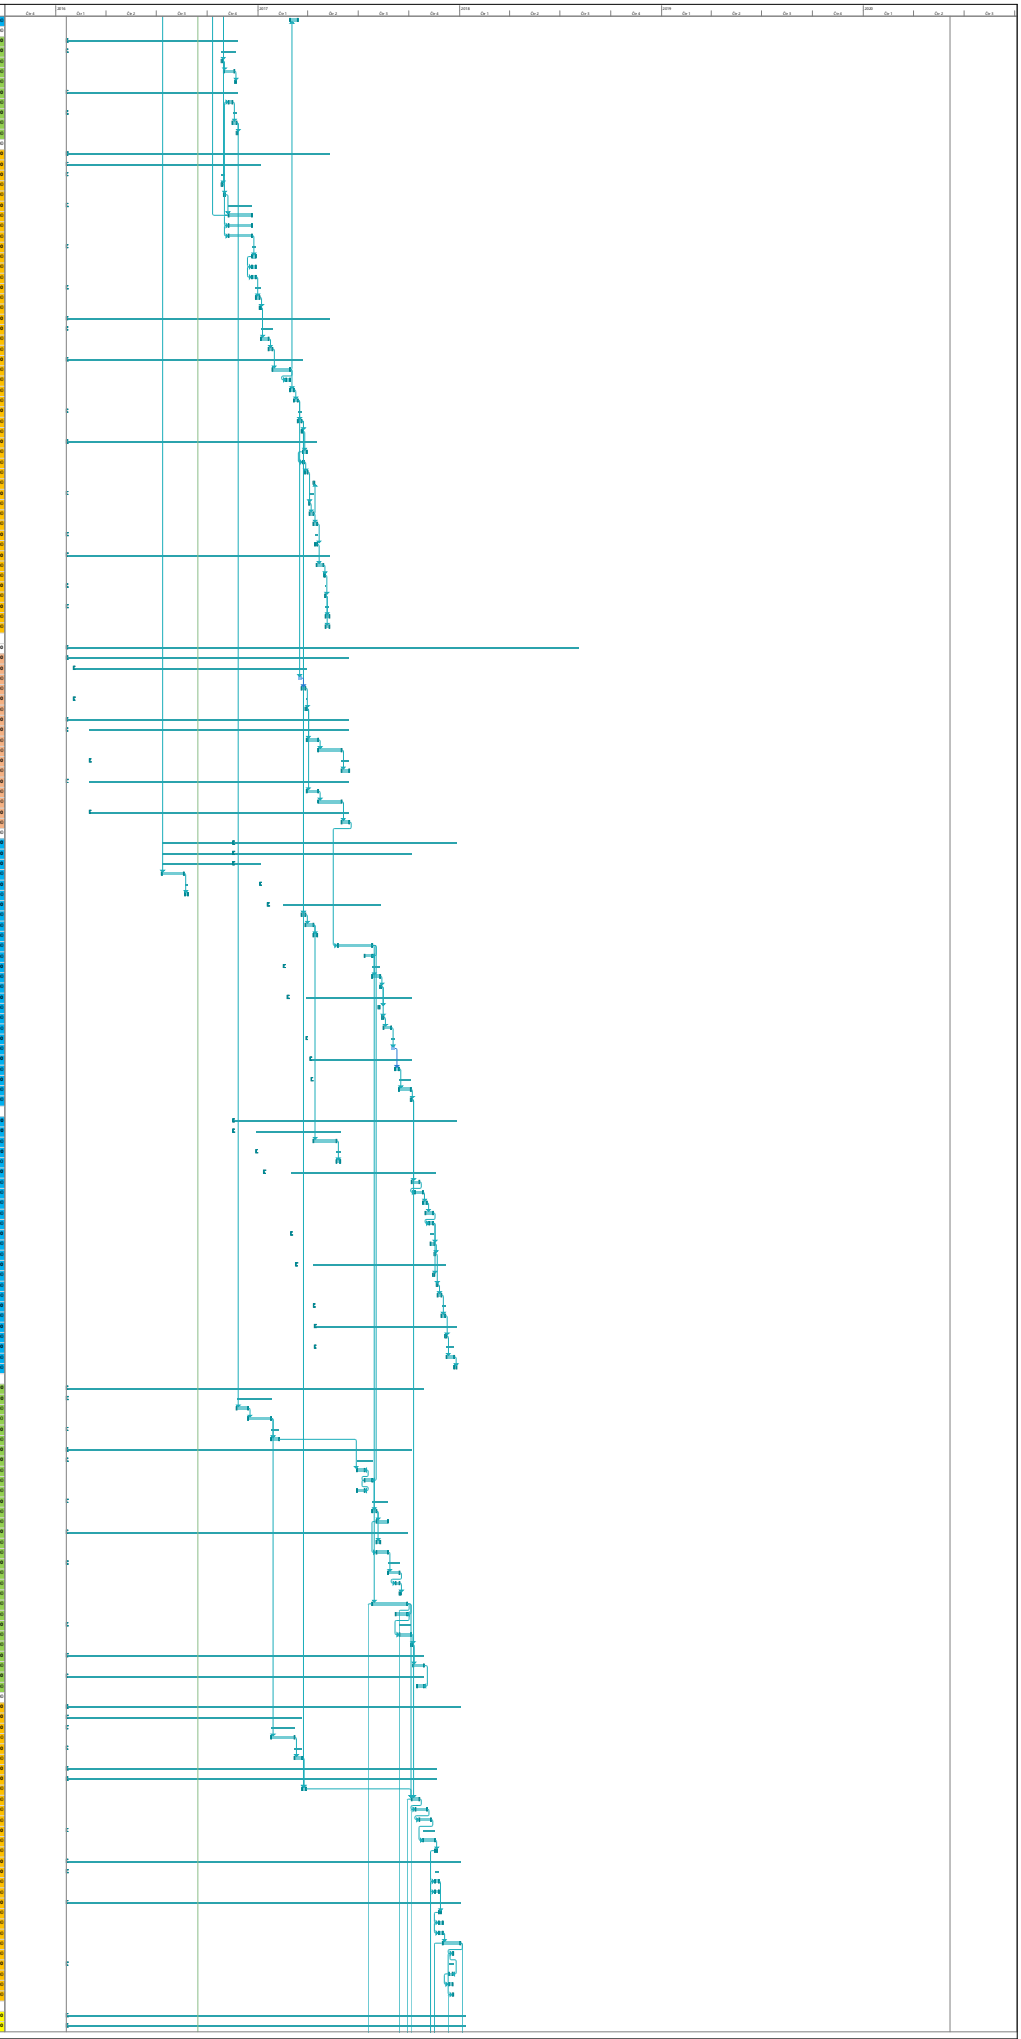

Projekt: Glagoj TP 2-1, 16 V2

Opravilo | Mejnik | Povzetek projekta | Neaktivno mejnik | Neaktivno opravilo | Ročno opravilo | Zlitno ročno opravilo | Le začetek | Zunanja opravila | Rok | Ročno napredovanje
Kazalčka | Poudarek | Neaktivno povzetek | Neaktivno povzetek | Letopisje | Ročno povzetek | Le dokončanje | Zunanji mejnik | Napredovanje

ID	Naziv naloge	Začetek	Zaključek	Trajanje	Stroški
384	**izvajanje komunikacijskih nalog v postopku JR in JO**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
385	sodelovanje pri pripravi JR in JO	Pet 28.11.17	Čet 30.11.17	3 dnevi	€0,00
386	sodelovanje z PR službo ministrstva	Pet 24.11.17	Čet 11.1.18	35 dnevi	€0,00
387	priprava predstavitvenega gradiva	Pet 17.11.17	Čet 30.11.17	10 dnevi	€0,00
388	redno pojasnjevanje v medijih	Pet 31.11.17	Čet 11.1.18	45 dnevi	€0,00
389	predstavitvene vsebine začrtovanega projekta	Pet 30.11.17	Čet 11.1.18	45 dnevi	€0,00
390					
391	**SODELOVANJE V POSTOPKU DPN IN CPVO**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
392	sodelovanje pri pripravi Predlog variant (Pv) in Okoljskega poročila (OP)	**tor 20.1.16**			**€0,00**
393	predstavitve in interpretacija dopolnjenih IDR in PZ udeležencu DPN in izdelovalcu	Čet 27.7.17	sre 16.8.17	15 dnevi	€0,00
394	sodelovanje pri pripravi osnutka ŠV in osnutka OP	Pet 13.10.17	Čet 2.11.17	15 dnevi	€0,00
395	javna razgrnitev (JR) in javna obravnava (JO) ter pravočrtna CPVO	**tor 20.1.16**			**€0,00**
396	sodelovanje pri pripravi gradiva za JR in JO	Pet 6.10.17	Pon 6.11.17	22 dnevi	€0,00
397	sodelovanje pri usklajevanju CPVO	Čet 25.9.17	Pet 20.10.17	22 dnevi	€0,00
398	aktivna udeležba na JO	tor 19.12.17	Tor 19.12.17	1 dan	€0,00
399					
400	**NOVELACIJA DOPOLNJENIH IDR IN PZ ZA PRIDOBITVI PREPOVEDI IZ JR**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
401	**novelacija dopolnjenih IDR po variantah**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
402	pridobitev pripombi dopolnjenih IDR in komentarjev iz JR s strani pripravljalca DPN in	tor 16.1.18	Pon 22.1.18	5 dnevi	€0,00
403	izdelava predlogov pripombi in komentarjev	tor 23.1.18	Pon 5.2.18	10 dnevi	€0,00
404	priprava osnutka novelacije dopolnjenih IDR po pridobljenih pripombah JR	tor 30.1.18	Sre 28.2.18	22 dnevi	€0,00
405	usklajevanje rešitev z investitorjem, pripravljalcem DPN, pripravljalcem DP,	Čet 22.2.18	sre 7.3.18	10 dnevi	€0,00
406	**priprava novelacije dopolnjenih IDR**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
407	novelacija dopolnjenih IDR	Čet 8.3.18	Sre 21.3.18	10 dnevi	€0,00
408	predaja dokumentacije naročniku	Čet 22.3.18	Pet 23.3.18	2 dnevi	€0,00
409	**novelacija PZ po novelaciji dopolnjenih IDR**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
410	pridobitev in pregled novelacije dopolnjenih IDR	Čet 15.2.18	sre 21.2.18	5 dnevi	€0,00
411	izdelava osnutka novelacije PZ glede novelacije dopolnjenih IDR	tor 13.1.18	Sre 28.2.18	10 dnevi	€0,00
412	usklajevanje osnutka novelacije PZ z naročnikom	Pon 26.3.18	Pet 30.3.18	5 dnevi	€0,00
413	**priprava novelacije PZ**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
414	novelacija PZ	Pon 26.3.18	Pet 6.4.18	10 dnevi	€0,00
415	predaja dokumentacije naročniku	Pon 9.4.18	Tor 10.4.18	2 dnevi	€0,00
416					
417	**OKOLJSKA PREVERITEV PO JR IN JO**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
418	**preveritev OP**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
419	pridobitev pripombi iz JR in JO	tor 16.1.18	Pon 29.1.18	10 dnevi	€0,00
420	osnutek dopolnjenega OP	tor 23.1.18	Sre 21.2.18	22 dnevi	€0,00
421	usklajevanje osnutka dopolnjenih OP v skladu s mnenji državnih NUP	Čet 8.2.18	sre 28.2.18	15 dnevi	€0,00
422	**priprava dopolnjenega OP**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
423	dopolnjeno OP	Čet 22.2.18	sre 7.3.18	10 dnevi	€0,00
424	**priprava odločbe o sprejemljivosti vplivov**	**tor 21.11.17**			**€0,00**
425	Odločba o sprejemljivosti vplivov	Čet 8.2.18	Pet 6.4.18	22 dnevi	€0,00
426					
427	**DOPOLNITEV ŠV IN CPVO**	**tor 21.11.17**			**€0,00**
428	**dopolnitev ŠV**	**tor 21.11.17**			**€0,00**
429	sodelovanje s pripravljalcem DPN za dopolnitev ŠV	tor 21.11.17	sre 20.12.17	22 dnevi	€0,00
430	**dopolnitev OP**	**tor 21.11.17**			**€0,00**
431	sodelovanje s pripravljalcem OP v postopku CPVO	tor 21.11.17	sre 20.12.17	22 dnevi	€0,00
432	**izbor optimalne variante**	**tor 9.1.18**			**€0,00**
433	sodelovanje s pripravljalcem DPN za ŠV za izbor optimalne variante	tor 9.1.18	Pon 22.1.18	10 dnevi	€0,00
434					€0,00
435	**STALIŠČA DO PRIPOMB**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
436	**pridobitev pripombi iz javne razgrnitve (koordinator)**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
437	koordinator pridobi pripombe iz JR in JO	tor 2.1.18	Pon 8.1.18	5 dnevi	€0,00
438	podljavje pripombi investitorju in izdelovalcu ŠV	tor 9.1.18	Pon 15.1.18	5 dnevi	€0,00
439	**stališča do pripombi in Predlogu optimalne variante**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
440	opredelitev do posameznih pripombi	tor 16.1.18	Tor 30.1.18	15 dnevi	€0,00
441	dokončna potrditev dodatnih strokovnih podlag	tor 2.1.18	Tor 9.1.18	5 dnevi	€0,00
442	priprava osnutka Stališč do pripombi in osnutka Predloga optimalne variante	tor 17.1.18	Tor 6.2.18	15 dnevi	€0,00
443	usklajevanje osnutka Stališč do pripombi in osnutka Predloga optimalne variante	Pet 2.2.18	Čet 8.2.18	5 dnevi	€0,00
444	**priprava dokumenta**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
445	Stališča do pripombi in osnutek Predloga optimalne variante	Pon 26.1.18	Pet 6.4.18	10 dnevi	€0,00
446	predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju	Pon 9.4.18	Tor 10.4.18	2 dnevi	€0,00
447	**1. mnenje državnih NUP in mnenja sprejemljivosti vplivov**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
448	priprava gradiva za 1. mnenje	tor 11.1.18	Tor 17.4.18	5 dnevi	€0,00
449	posredovanje gradiva drž.NUP	tor 18.4.18	Čet 19.4.18	2 dnevi	€0,00
450	medresorno usklajevanje	Pon 20.4.18	Čet 10.5.18	15 dnevi	€0,00
451	**priprava mnenj NUP**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
452	mnenje posamznega drž.sektorja NUP	Pet 27.4.18	Čet 10.5.18	10 dnevi	€0,00
453	skor mnenj državnih NUP	Pet 11.5.18	Čet 17.5.18	5 dnevi	€0,00
454	posredovanje mnenj državnih NUP pobudniku in investitorju	Pet 18.5.18	Pon 21.5.18	2 dnevi	€0,00
455	**PREDLOG NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE (PNV)**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
456	**pregled mnenj državnih NUP**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
457	pridobitev in analiza mnenj drž.sektorjev NUP	tor 22.5.18	Pon 4.6.18	10 dnevi	€0,00
458	usklajevanje med izdelovalcem ŠV, izdelovalcem OP, investitorjem,	tor 22.5.18	Pon 4.6.18	10 dnevi	€0,00
459	**priprava PNV**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
460	dopolnitev ŠV in osnutka PNV	tor 5.6.18	Pon 18.6.18	10 dnevi	€0,00
461	**priprava PNV**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
462	PNV	tor 12.6.18	Pon 25.6.18	10 dnevi	€0,00
463	predaja PNV investitorju, pobudniku in koordinatorju	tor 26.6.18	sre 27.6.18	2 dnevi	€0,00
464	**Sklep Vlade RS**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
465	**priprava sklepa**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
466	koordinator pripravi osnutek Sklepa Vlade RS	tor 5.6.18	Pon 11.6.18	5 dnevi	€0,00
467	usklajevanje osnutka Sklepa z deležniki	Čet 28.6.18	tor 17.7.18	15 dnevi	€0,00
468	**priprava Sklepa Vlade RS**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
469	Sklep Vlade RS	Čet 5.7.18	sre 11.7.18	5 dnevi	€0,00
470	**Sprejetje na Vladi RS**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
471	posredovanje gradiva za na Vlado RS	Čet 12.7.18	Sre 25.7.18	10 dnevi	€0,00
472	obravnava gradiva na seji Vlade RS	Čet 26.7.18	Čet 26.7.18	1 dan	€0,00
473	**sprejem Sklepa na Vladi RS**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
474	odločitev Vlade	Pet 27.7.18	Pet 27.7.18	1 dan	€0,00
475	**obvestilo koordinatorju o sprejetju sklepa**	**tor 20.1.16**			**€0,00**
476	koordinator obvesti investitorja, pobudnika ter izdelovalca ŠV in OP	Pon 30.7.18	Pet 3.8.18	5 dnevi	€0,00
477	objava Sklepa na spletu	Pon 30.7.18	Pet 3.8.18	5 dnevi	€0,00
478					
479	**3 FAZA**	**tor 2.2.16**			**€3.108.000,00**
480	**PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA 3 FAZO NAČRTOVANJA**	**tor 2.2.16**			**€1.900.000,00**
481	**dokončno potrebnih strokovnih podlag**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
482	pregled in opredelitev do dodatnega predloga potrebnih strokovnih podlag	tor 5.6.18	Pon 18.6.18	10 dnevi	€0,00
483	usklajevanje investitorja s projektantom	tor 12.6.18	Pon 18.6.18	5 dnevi	€0,00
484	**priprava usklajenega seznama potrebnih strokovnih podlag**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
485	seznam potrebnih dodatnih strokovnih podlag na podlagi smernic	tor 12.6.18	Pon 18.6.18	5 dnevi	€0,00
486	**pridobitev soglasja strokovnih podlag**	**tor 2.2.16**			**€1.900.000,00**
487	**geološko raziskave za potrebe IDP in PGD**	**tor 2.2.16**			**€900.000,00**
488	priprava projektne naloge	tor 19.6.18	Sre 18.7.18	22 dnevi	€0,00
489	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Čet 19.7.18	Sre 29.8.18	30 dnevi	€900.000,00
490	**izbor izvajalca**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
491	sklep o izboru izvajalca	Čet 30.8.18	Sre 12.9.18	10 dnevi	€0,00
492	izvajanje naloge	Čet 13.9.18	Sre 12.12.18	65 dnevi	€0,00
493	**dodatne hidrološke raziskave**	**tor 2.2.16**			**€150.000,00**
494	priprava projektne naloge	Tor 16.6.18	Pon 27.7.18	10 dnevi	€0,00
495	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	tor 3.7.18	Pon 13.8.18	30 dnevi	€150.000,00
496	**izbor izvajalca**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
497	sklep o izboru izvajalca	tor 14.8.18	Pon 27.8.18	10 dnevi	€0,00
498	izvajanje naloge	Tor 28.8.18	Pon 22.10.18	40 dnevi	€0,00
499	**potrebne dodatne prostorske in okoljske strokovne podlage**	**tor 2.2.16**			**€500.000,00**
500	priprava projektne naloge	Tor 19.6.18	Pon 9.7.18	15 dnevi	€0,00
501	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	tor 10.7.18	Pon 20.8.18	30 dnevi	€500.000,00
502	**izbor izvajalca**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
503	sklep o izboru izvajalca	Tor 21.8.18	Pon 3.9.18	10 dnevi	€0,00
504	izvajanje naloge	Tor 4.9.18	Pon 29.10.18	40 dnevi	€0,00
505	**dodatne dodatne tehnične strokovne podlage**	**tor 2.2.16**			**€150.000,00**
506	priprava projektne naloge	Tor 19.6.18	Pon 9.7.18	15 dnevi	€0,00
507	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	tor 10.7.18	Pon 20.8.18	30 dnevi	€150.000,00
508	**izbor izvajalca**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
509	sklep o izboru izvajalca	Tor 21.8.18	Pon 3.9.18	10 dnevi	€0,00
510	izvajanje naloge	Tor 4.9.18	Pon 29.10.18	40 dnevi	€0,00
511					
512	**ŠIRŠI PROJEKT**	**tor 2.2.16**			**€850.000,00**
513	**IZDELAVA VIŠINSKEGA PROJEKTA (ŠDP)**	**tor 2.2.16**			**€850.000,00**
514	**naročilo ažuriranja projekta**	**tor 2.2.16**			**€850.000,00**
515	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IDP	Pon 15.1.18	Pet 9.3.18	40 dnevi	€850.000,00
516	**izbor izvajalca IDP**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
517	sklep o izboru izvajalca IDP	tor 12.3.18	Pet 23.3.18	10 dnevi	€0,00
518	**izdelava IDP**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
519	pregled novelacije dopolnjenih IDR s predlogom optimalne variante ter izdele	Pon 26.2.18	Pet 6.4.18	30 dnevi	€0,00
520	**priprava nabora potrebnih strokovnih podlag**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
521	sodelovanje z investitorjem pri pripravi zaprose dokumentacije	Pon 26.3.18	Pet 4.5.18	10 dnevi	€0,00
522	sodelovanje s pripravljalci strokovnih podlag	tor 13.7.18	Sre 28.11.18	100 dnevi	€0,00
523	pridobitev in preverjanje strokovnih podlag	Čet 8.10.18	Sre 14.11.18	30 dnevi	€0,00
524	**priprava osnutka IDP**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
525	priprava osnutka IDP	Čet 9.5.18	sre 12.12.18	30 dnevi	€0,00
526	usklajevanje osnutka IDP z naročnikom	tor 13.11.18	Sre 12.12.18	22 dnevi	€0,00
527	**izdelava IDP**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
528	dopolnjevanje osnutka IDP po usklajevanju z naročnikom	Čet 8.11.18	Sre 19.12.18	30 dnevi	€0,00
529	predaja IDP naročniku	Čet 20.12.18	Pet 21.12.18	2 dnevi	€0,00
530	**recenzija IDP**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
531	sklep o izdelovi recenzijske skupine za IDP	Čet 20.12.18	Pet 21.12.18	2 dnevi	€0,00
532	pozvedbarja IDP recenzentom	Pon 24.12.18	Pet 25.12.18	2 dnevi	€0,00
533	recenzija IDP	sre 26.12.18	Čet 24.1.19	22 dnevi	€0,00
534	**predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
535	recenzijsko poročilo za IDP	Pon 28.1.19	Čet 31.1.19	4 dnevi	€0,00
536	**dopolnitev IDP po recenziji**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
537	pridobitev recenzijskega poročila oz. recenzijskih pripomočkov za IDP	tor 1.2.19	Pon 4.2.19	2 dnevi	€0,00
538	**dopolnitev oz. prilagoditev IDP po recenziji**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
539	dopolnjeno IDP (na recenzijo)	Čet 14.2.19	Sre 13.3.19	20 dnevi	€0,00
540	predaja IDP (po recenziji) naročniku	tor 19.3.19	Pon 18.3.19	2 dnevi	€0,00
541					
542	**IZDELAVA DOKUMENTA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (PP)**	**tor 20.12.17**			**€10.000,00**
543	**naročilo IP**	**tor 20.12.17**			**€10.000,00**
544	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IP	tor 12.1.18	Pet 27.4.18	15 dnevi	€0,00
545	**izbor izvajalca IP**	**tor 2.2.18**			**€10.000,00**
546	sklep o izboru izvajalca IP	tor 30.4.18	Pet 11.5.18	10 dnevi	€10.000,00
547	**izdelava IP za varianto obdelava v IDP**	**tor 20.2.18**			**€0,00**
548	pregled izdelanega IDP	tor 27.11.18	sre 26.12.18	22 dnevi	€0,00
549	pridobitev sredstev projekta po IDP	tor 11.12.18	sre 26.12.18	10 dnevi	€0,00
550	priprava strukture	Čet 13.12.18	Pet 21.12.18	5 dnevi	€0,00
551	priprava osnutka IP	tor 14.1.19	Tor 12.2.19	22 dnevi	€0,00
552	usklajevanje osnutka z naročnikom	tor 8.2.19	Čet 14.2.19	5 dnevi	€0,00
553	**izdelava IP po IDP**	**Pet 6.4.18**			**€0,00**
554	IP	tor 19.2.19	Pon 18.3.19	5 dnevi	€0,00
555	predaja IP naročniku	tor 19.2.19	sre 20.2.19	2 dnevi	€0,00
556	**recenzija IP**	**tor 19.4.18**			**€0,000,00**
557	sklep o izdelovi recenzijske skupine za IP	tor 19.2.19	Sre 20.2.19	2 dnevi	€0,00
558	pozvedbarja IP recenzentom	Čet 21.2.19	Pet 22.2.19	2 dnevi	€0,00
559	recenzija IP	Pon 25.2.19	Pet 8.3.19	10 dnevi	€0,000,00
560	**predstavitev recenzijskih ugotovitev investitorju**	**Čet 3.5.18**			**€0,00**
561	recenzijsko poročilo za IP	Pon 11.3.19	Pet 15.3.19	5 dnevi	€0,00
562	**dopolnitev IP po recenziji**	**tor 19.4.18**			**€0,00**
563	pridobitev recenzijskega poročila oz. recenzijskih pripomočkov za IP	tor 18.3.19	Tor 19.3.19	2 dnevi	€0,00
564	**dopolnitev oz. prilagoditev IP po recenziji**	**Čet 17.5.18**			**€0,00**
565	IP (po recenziji)	tor 19.3.19	Tor 2.4.19	10 dnevi	€0,00
566	predaja IP (po recenziji) naročniku	tor 2.4.19	Čet 4.4.19	2 dnevi	€0,00
567					
568	**POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PoVVO) IN POSTOPEK VPLIVA NA OKOLJE (POO)**	**tor 2.2.16**			**€150.000,00**
569	**naročilo PoVVO**	**tor 2.2.16**			**€150.000,00**
570	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za PoVVO	Čet 22.2.18	sre 18.4.18	40 dnevi	€150.000,00
571	**izbor izvajalca PoVVO**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
572	sklep o izboru izvajalca PoVVO	Čet 19.4.18	sre 2.5.18	10 dnevi	€0,00
573	**izdelava PoVVO**	**tor 2.2.16**			**€0,00**
574	pregled izdelanega IDP in izdelanih okoljskih strokovnih podlag	tor 27.11.18	Pon 31.12.18	30 dnevi	€0,00
575	priprava osnutka PoVVO	tor 15.12.18	Pon 11.2.19	45 dnevi	€0,00
576	usklajevanje z izdelovalcem IDP	tor 12.2.19	Pon 25.3.19	30 dnevi	€0,00
577	usklajevanje z investitorjem, pobudnikom, koordinatorjem ter MOP in njenim	tor 26.3.19	Pon 25.3.19	40 dnevi	€0,00
578	priprava Osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	Pon 26.3.19	Pon 1.4.19	5 dnevi	€0,00
579					€0,00

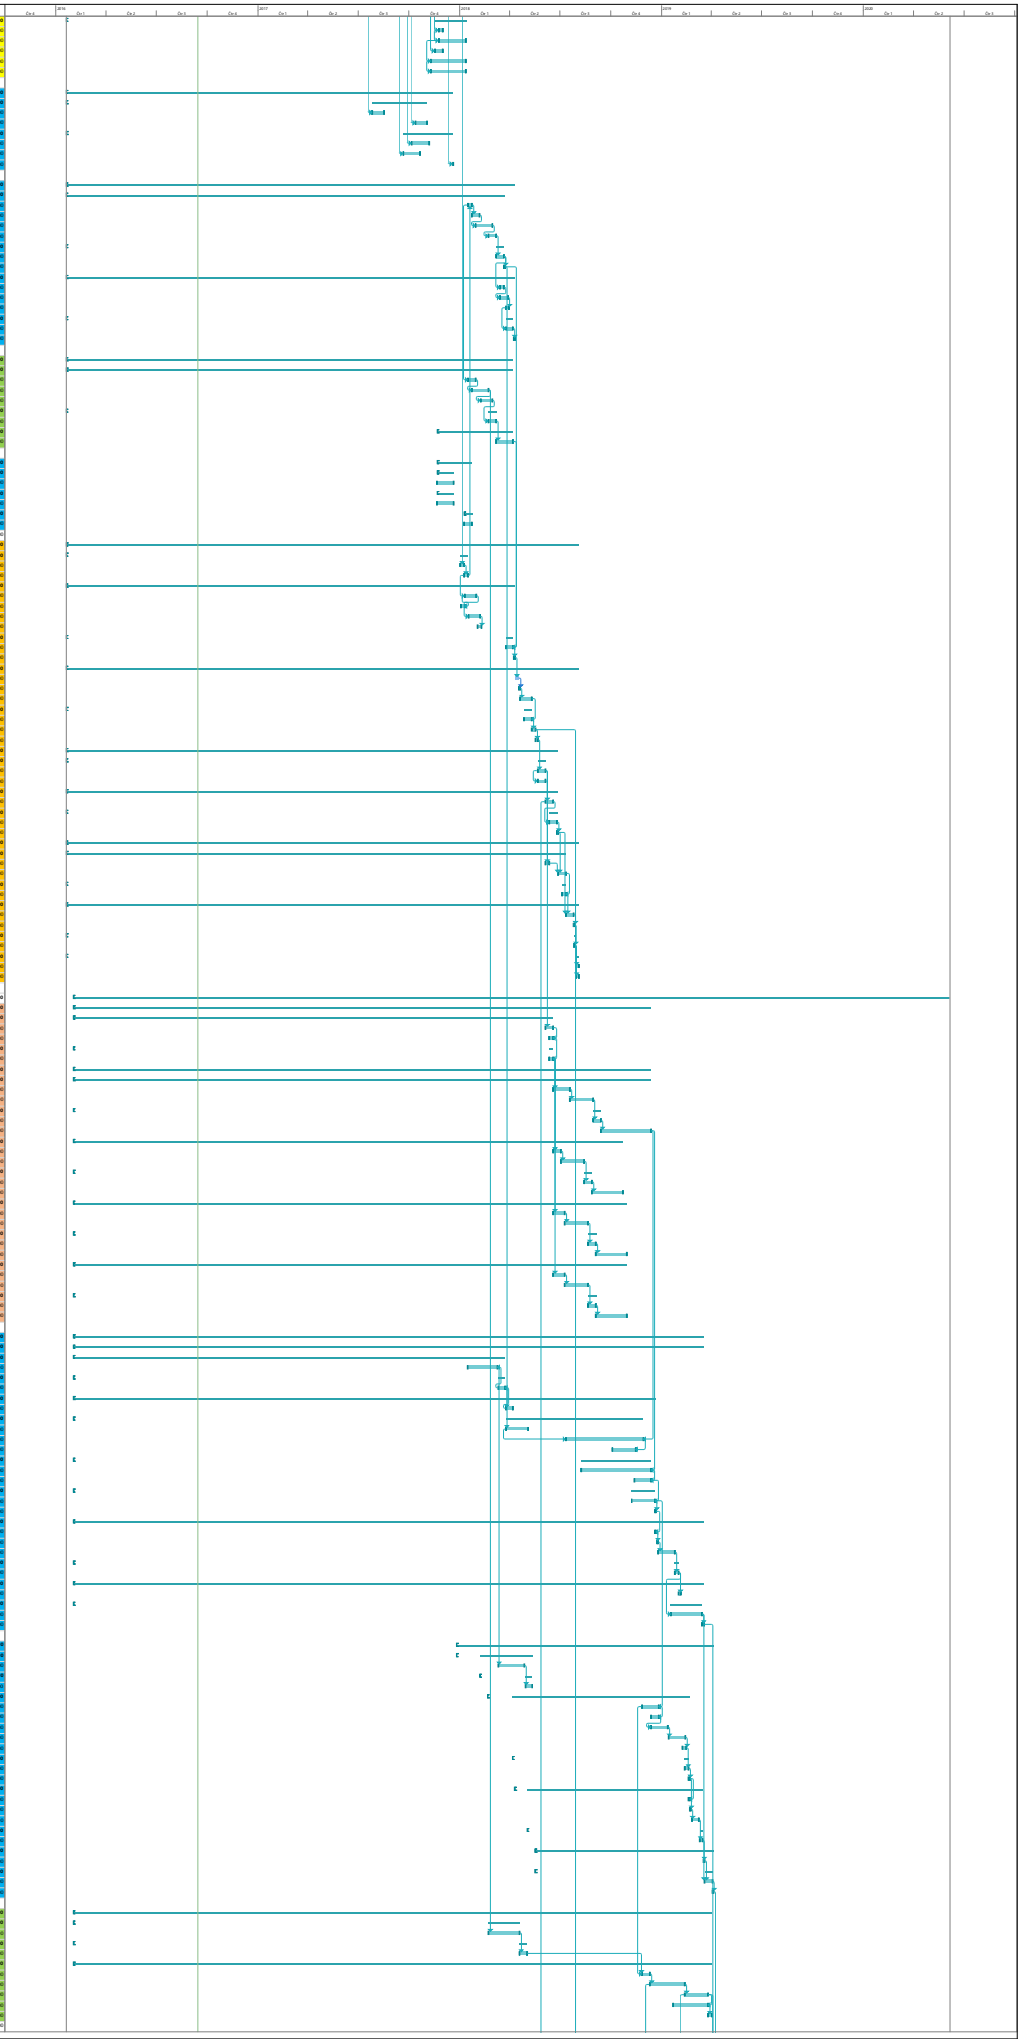

Projekt: Ureditev TP 2-1, 16 V2

Opravilo | Mejnik | Povzetek projekta | Neaktivno mejnik | Ročno opravilo | Zimsko vzdrževanje | Le začetek | Zunanja opravila | Rok | Ročno napredovanje
Razširitev | Povzetek | Neaktivno opravilo | Neaktivni povzetek | Letajoče | Ročno povzetek | Le dokončanje | Zunanji mejnik | Napredovanje

ID	Naziv opravila	Začetek	Zaključek	Trajanje	Stroški
189	**SPREJETJE DPN**	**Tor 2.2.16**			**€150.000,00**
190	**NARAČILO DPN**	**Tor 2.2.16**			**€150.000,00**
191	**naročilo izdelave osnutka in predloga DPN**	**Tor 2.2.16**			**€150.000,00**
192	izdelava in izvedba razpisa za oddajo del	Tor 5.1.16	Pon 16.7.18	30 dnevi	€150.000,00
193	**izbor izvajalca**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
194	sklep o izboru izdelovalca osnutka in predloga DPN	Tor 17.7.18	Pon 30.7.18	10 dnevi	€0,00
195	**OSNUTEK DPN**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
196	**priprava ŠV**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
197	priprava prilogovih izhodišč in 10 ter priporočil iz 1. revizije državnih NUP in revizije o	Tor 31.7.18	Pon 13.8.18	10 dnevi	€0,00
198	pridobitev IGP, IP, PuVVO ter ostalih okoljskih in prostorskih strokovnih podlag	Pet 5.4.19	Čet 11.4.19	5 dnevi	€0,00
199	priprava prvega osnutka DPN	Pet 22.3.19	Čet 9.5.19	35 dnevi	€0,00
200	usklajevanje osnutka DPN	Pet 22.3.19	Čet 23.5.19	45 dnevi	€0,00
201	**priprava osnutka DPN po usklajevanju**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
202	osnutek DPN	Tor 14.5.19	Pon 27.5.19	10 dnevi	€0,00
203	pretoja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju	Tor 28.5.19	Sre 29.5.19	2 dnevi	€0,00
204	**JAVNA RAZGRNITEV (JR) IN JAVNA OBRAVNAVA (JO)**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
205	**priprava gradiva za JR in JO**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
206	priprava povzetkov osnutka DPN in PuVVO	Tor 28.5.19	Pon 3.6.19	5 dnevi	€0,00
207	usklajitev izvedbe JR z investitorjem, pobudnikom in koordinatorjem	Tor 21.5.19	Pon 3.6.19	10 dnevi	€0,00
208	**javna razgrnitev**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
209	koordinator objavi obvestilo o javni obravnavi	Tor 4.6.19	Pon 10.6.19	5 dnevi	€0,00
210	posredovanje gradiva NUP in lokalni skupnosti	Tor 4.6.19	Pon 10.6.19	5 dnevi	€0,00
211	objava gradiva na spletu	Tor 4.6.19	Pon 10.6.19	5 dnevi	€0,00
212	javna razgrnitev	Tor 11.6.19	Pon 22.7.19	30 dnevi	€0,00
213	objava izvedbe javne obravnave	Pon 10.6.19	Pon 10.6.19	1 dan	€0,00
214	**izvedba javne obravnave**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
215	gradivo za javno obravnavo	Tor 4.6.19	Pon 10.6.19	5 dnevi	€0,00
216	priprava javne obravnave	Tor 4.6.19	Pon 10.6.19	5 dnevi	€0,00
217	aktivna udeležba na javni obravnavi (pripravljalca DPN, pobudnika,	Pon 8.7.19	Pon 8.7.19	1 dan	€0,00
218					
219	**KOMUNIKACIJA - 3 FAZA**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
220	**izvajanje programa v postopku osnutka DPN in PuVVO**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
221	**izvajanje komunikacijskih nalog v postopku JR in JO**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
222	sodelovanje pri pripravi JR in JO	Tor 28.5.19	Pon 17.6.19	15 dnevi	€0,00
223	sodelovanje z IPA Službo ministrstva	Tor 28.5.19	Pon 17.6.19	15 dnevi	€0,00
224	priprava predstavitvenega gradiva	Tor 28.5.19	Pon 17.6.19	15 dnevi	€0,00
225	redno pojavljanje v medijih	Tor 28.5.19	Pon 29.7.19	45 dnevi	€0,00
226	predstavljanje učinkov načrtovanega projekta	Tor 28.5.19	Pon 29.7.19	45 dnevi	€0,00
227					
228	**SODELOVANJE V POSTOPKU DPN IN PuVVO**				**€0,00**
229	**Sodelovanje pri pripravi Osnutka DPN in PuVVO**				**€0,00**
230	predstavitev in interpretacija IGP in IP izdelovalcu DPN in izdelovalcu PuVVO	Tor 11.12.18	Pon 24.12.18	10 dnevi	€0,00
231	sodelovanje pri pripravi osnutka DPN, PuVVO in osnutka OVS	Pet 28.2.19	Čet 9.5.19	30 dnevi	€0,00
232	**javna in zgodnja (JR) in javna obravnava (JO) ter preveritev OVS**	**Čet 25.4.18**			**€0,00**
233	sodelovanje pri pripravi gradiva za JR in JO	Tor 28.5.19	Pon 17.6.19	15 dnevi	€0,00
234	sodelovanje pri usklajevanju OVS	Tor 12.2.19	Pon 12.3.19	15 dnevi	€0,00
235	aktivna udeležba na JO	Pon 8.7.19	Pon 8.7.19	1 dan	€0,00
236					
237	**STALIŠČA DO PRIPOMB**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
238	**pridobitev pripomb ki javne razgrnitve (koordinator)**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
239	koordinator pridobi pripombe iz JR in JO	Tor 28.7.19	Pon 5.8.19	10 dnevi	€0,00
240	podljanje pripomb investitorju in izdelovalcu osnutka DPN	Tor 30.7.19	Pon 5.8.19	5 dnevi	€0,00
241	**stališča do pripomb**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
242	operativno do posameznih pripomb	Tor 6.8.19	Pon 26.8.19	15 dnevi	€0,00
243	dokončno pomembnih dodatnih strokovnih podlag	Tor 20.8.19	Pon 26.8.19	5 dnevi	€0,00
244	priprava osnutka Stališč do pripomb	Tor 20.8.19	Pon 2.9.19	10 dnevi	€0,00
245	usklajevanje osnutka Stališč do pripomb	Tor 20.8.19	Pon 9.9.19	15 dnevi	€0,00
246	**priprava dokumenta**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
247	Stališča do pripomb	Čet 5.9.19	Sre 11.9.19	5 dnevi	€0,00
248	predaja dokumenta investitorju, pobudniku in koordinatorju	Čet 12.9.19	Pet 13.9.19	2 dnevi	€0,00
249					€0,00
250	**NOVELACIJA IDP IN IP PO PRIDOBITVI PRIPOMB IZ JR**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
251	**novelacija IDP**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
252	pridobitev pripadajočih pripomb in komentarjev iz JR z izrazom pripravljalca DPN in	Tor 6.8.19	Pon 12.8.19	5 dnevi	€0,00
253	analiza pridobljenih pripomb in komentarjev	Tor 13.8.19	Pon 26.8.19	10 dnevi	€0,00
254	pregled dopolnjenih in novih strokovnih podlag	Tor 20.8.19	Pon 7.10.19	30 dnevi	€0,00
255	priprava osnutka novelacije IDP po pridobljenih pripombah JR	Tor 27.8.19	Pon 7.10.19	30 dnevi	€0,00
256	usklajevanje rešitev z investitorjem, pripravljalcem DPN, pripravljalcem PuVVO,	Tor 1.10.19	Pon 14.10.19	10 dnevi	€0,00
257	**priprava novelacije IDP**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
258	novelacija IDP	Tor 1.10.19	Pon 21.10.19	15 dnevi	€0,00
259	predaja dokumentacije naročniku	Tor 22.10.19	Sre 23.10.19	2 dnevi	€0,00
260	**novelacija IP po novelaciji IDP**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
261	pridobitev in pregled novelacije IDP	Tor 23.10.19	Pon 28.10.19	5 dnevi	€0,00
262	izdelava osnutka novelacije IP glede na novelacijo IDP	Tor 22.10.19	Pon 4.11.19	10 dnevi	€0,00
263	usklajevanje osnutka novelacije IP z naročnikom	Čet 31.10.19	Sre 6.11.19	5 dnevi	€0,00
264	**priprava novelacije IP**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
265	novelacija IP	Čet 7.11.19	Sre 13.11.19	5 dnevi	€0,00
266	predaja dokumentacije naročniku	Čet 14.11.19	Pet 15.11.19	2 dnevi	€0,00
267					
268	**DOPOLNITEV PuVVO**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
269	**pripravlja 1a IN in JO**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
270	pridobitev in analiza pripomb	Tor 6.8.19	Pon 12.8.19	5 dnevi	€0,00
271	usklajevanje z izdelovalcem IDP	Tor 24.9.19	Pon 14.10.19	15 dnevi	€0,00
272	dopolnitev osnutka PuVVO	Ned 27.9.19	Čet 17.10.19	15 dnevi	€0,00
273	usklajevanje osnutka dopolnjenih OP v skladu 2. revizije državnih NUP	Sre 4.12.19	Tor 31.12.19	20 dnevi	€0,00
274	**priprava PuVVO**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
275	PuVVO	Sre 1.1.20	Tor 7.1.20	5 dnevi	€0,00
276	**priprava Okoljevarstvenega soglasja (OVS)**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
277	OVS	Sre 8.1.20	Tor 18.2.20	30 dnevi	€0,00
278	preverjanje vplivov OVS	Sre 19.2.20	Tor 25.2.20	5 dnevi	€0,00
279	**sprejem Uredbe na Vlado RS**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
280	odločitev Vlade	Pon 6.1.20	Pet 22.5.20	15 dnevi	€0,00
281	objava Uredbe v Uradnem listu RS	Pon 25.5.20	Pet 29.5.20	5 dnevi	€0,00
282	obvestilo koordinatorju o sprejetju Uredbe	Pon 25.5.20	Pet 29.5.20	5 dnevi	€0,00
283					
284	**PREDLOGI DPN**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
285	**Predlog DPN**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
286	skladno s Stališči do pripomb priprava osnutka predloga DPN	Pon 16.9.19	Pet 4.10.19	15 dnevi	€0,00
287	usklajevanje osnutka predloga DPN z investitorjem, pobudnikom in	Pon 23.9.19	Pet 1.11.19	30 dnevi	€0,00
288	**priprava Predloga DPN**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
289	Predlog DPN	Pon 28.10.19	Pet 8.11.19	15 dnevi	€0,00
290	predaja dokumentacije investitorju, pobudniku in koordinatorju	Pon 11.11.19	Tor 12.11.19	2 dnevi	€0,00
291	**2. revizija državnih NUP in revizija sprejemljivosti vplivov**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
292	priprava gradiva za 2. revizijo	Pon 11.11.19	Pet 22.11.19	10 dnevi	€0,00
293	posredovanje gradiva državnim NUP	Pon 25.11.19	Pet 29.11.19	5 dnevi	€0,00
294	medresorsko usklajevanje	Pon 2.12.19	Tor 31.12.19	22 dnevi	€0,00
295	**priprava novej NUP**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
296	revizija posamezniega državnega NUP	Sre 1.1.20	Tor 21.1.20	15 dnevi	€0,00
297	stor novej državnih NUP	Sre 22.1.20	Tor 28.1.20	5 dnevi	€0,00
298	posredovanje novej državnih NUP pobudniku in investitorju	Sre 29.1.20	Čet 30.1.20	2 dnevi	€0,00
299					
300	**DOPOLNITEV PREDLOGA DPN IN PuVVO**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
301	**dopolnitev predloga DPN**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
302	izdelovanje z pripravljalcem DPN za predlog DPN	Pet 3.2.20	Ned 9.2.20	12 dnevi	€0,00
303	**dopolnitev PuVVO**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
304	sodelovanje z pripravljalcem PuVVO v postopku PVO	Pet 13.3.19	Pon 14.10.19	22 dnevi	€0,00
305					
306	**DOPOLNJEN PREDLOG DPN**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
307	**pregled novej državnih NUP**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
308	pridobitev in analiza novej državnih NUP	Pet 31.1.20	Čet 20.2.20	15 dnevi	€0,00
309	usklajevanje med izdelovalcem predloga DPN, izdelovalcem PuVVO, investitorjem,	Pet 7.2.20	Čet 19.3.20	30 dnevi	€0,00
310	**priprava dopolnjenega predloga DPN**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
311	dopolnitev predloga DPN	Tor 3.3.20	Pon 23.3.20	15 dnevi	€0,00
312	**priprava dopolnjenega predloga DPN**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
313	dopolnjen predlog DPN	Tor 10.3.20	Pon 23.3.20	10 dnevi	€0,00
314	pretoja dopolnjenega predloga investitorju, pobudniku in koordinatorju	Pet 24.3.20	Sre 25.3.20	2 dnevi	€0,00
315	**Sklep Vlade RS**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
316	**priprava sklepa**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
317	koordinator pripravi vorutek Uredbe Vlade RS	Čet 26.3.20	Sre 1.4.20	5 dnevi	€0,00
318	usklajevanje osnutka Uredbe z deležniki	Čet 26.3.20	Pet 24.4.20	22 dnevi	€0,00
319	**priprava Uredbe Vlade RS**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
320	Uredba Vlade RS	Pon 20.4.20	Pet 24.4.20	5 dnevi	€0,00
321	**Sprejetje na Vlado RS**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
322	posredovanje gradiva za na Vlado RS	Pon 27.4.20	Pet 15.5.20	15 dnevi	€0,00
323	obravnava gradiva na seji Vlade RS	Pon 18.5.20	Pet 22.5.20	5 dnevi	€0,00
324	**sprejem Uredbe na Vlado RS**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
325	odločitev Vlade	Pet 22.5.20	Pet 22.5.20	1 dan	€0,00
326	objava Uredbe v Uradnem listu RS	Pon 25.5.20	Pet 29.5.20	5 dnevi	€0,00
327	obvestilo koordinatorju o sprejetju Uredbe	Pon 25.5.20	Pet 29.5.20	5 dnevi	€0,00
328					
329	**KOMUNIKACIJA ZAKLJUČEK**	**Tor 2.2.16**			**€0,00**
330	velja medijska objava pri sprejemu Uredbe na Vladi RS	Pon 18.5.20	Pet 5.6.20	15 dnevi	€0,00

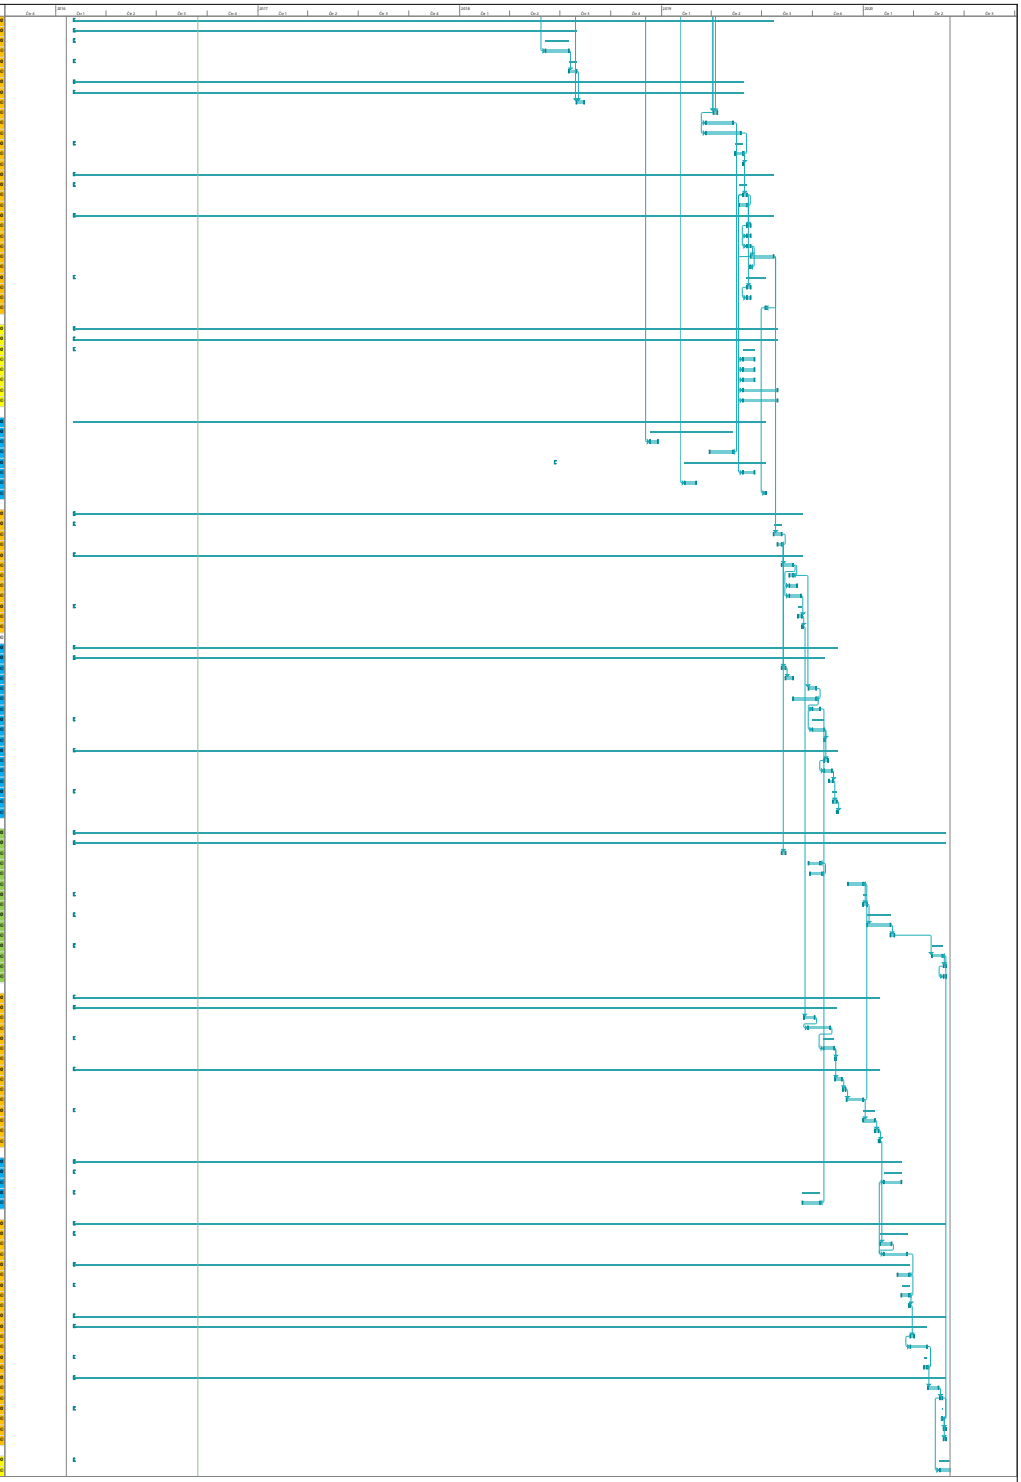

Projekt sklepu TP15, 16 V2

Opravilo | Mejnik | Povzetek projekta | Neaktivni mejnik | Ročno opravilo | Zlitno ročno opravilo | Le začetek | Zunanja opravila | Rok | Ročno napredovanje
Kazalnika | Povzetek | Neaktivno opravilo | Neaktivni povzetek | Letopisje | Ročno povzetek | Le dokončanje | Zunanji mejnik | Napredovanje
